






## Lehrter Straße: Immissionsminderungskonzept

- **Verminderung Staubimmissionen**


- Einrichtung Hauptwässerungspunkte zur Befeuchtung der Zu- und Ausfahrten 
- Einrichtung Bedarfswässerung bei starker Staubentwicklung, punktuelle Wässerung z.B. von Haufwerken 
- Schließen der Zufahrt 3 für den Baustellenverkehr 
- Aufforderung der Firmen zu langsamer Fahrweise auf der Baustelle (max. 15km/h) 
- Durchführung von wöchentlichen Erfolgskontrollen durch GG
- Übergabe Leitfaden „Vermeidung und Verminderung von Staubemissionen auf Baustellen“ an die vor Ort tätigen Firmen und schriftliche Aufforderung zur Umsetzung der Empfehlungen sowie zur Einhaltung des Landesimmissionsschutzgesetzes

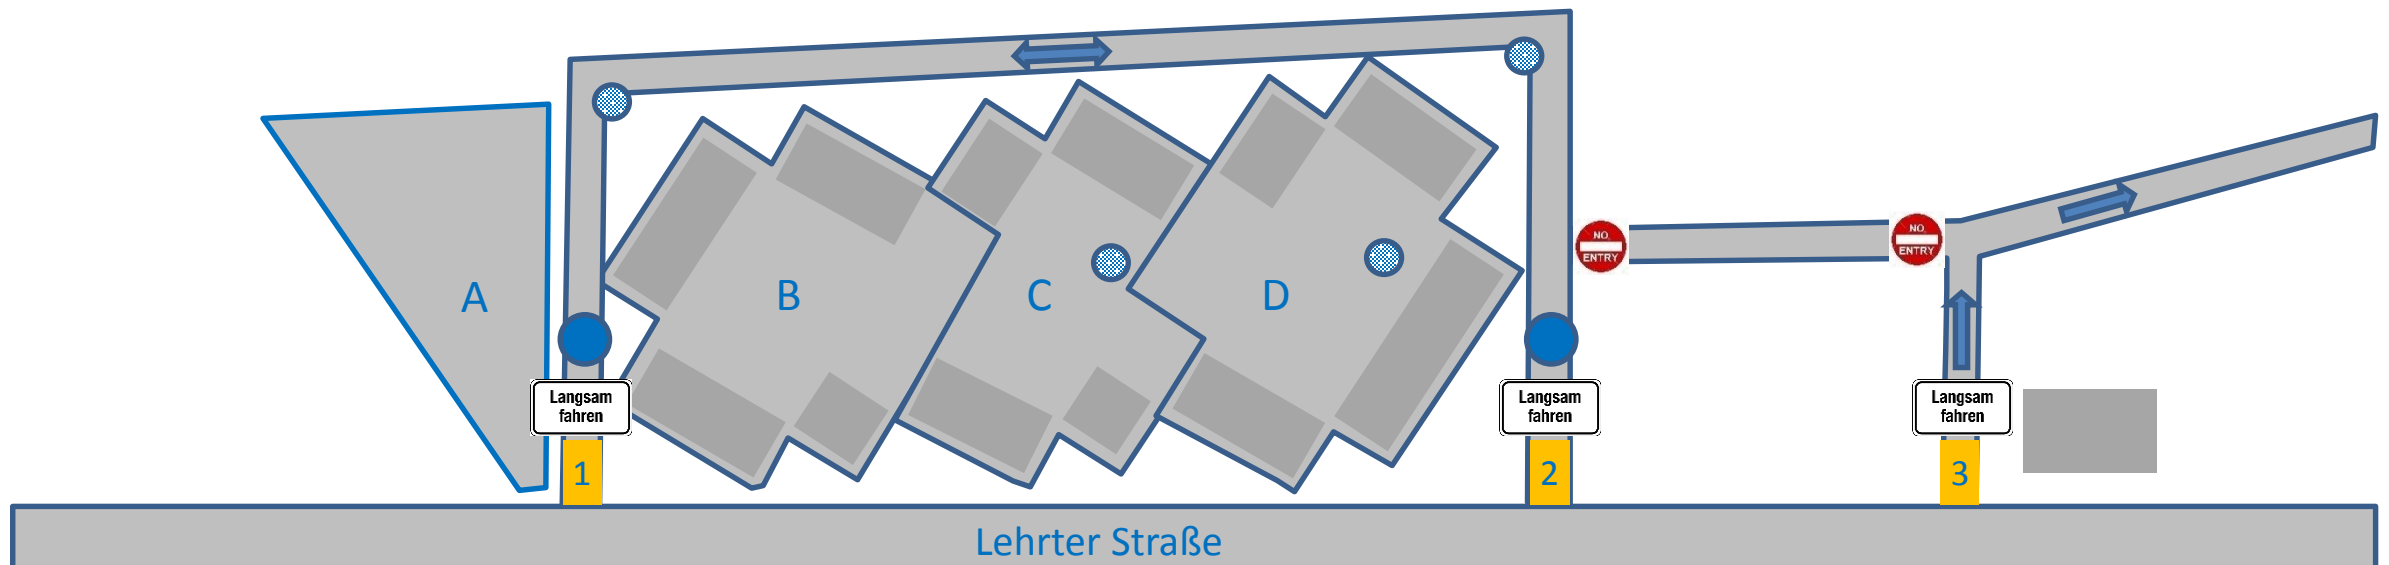

## Lehrter Straße: Immissionsminderungskonzept

- **Verminderung Lärmimmissionen**

- Alle auf der Baustelle tätigen Firmen werden zur Einhaltung der zulässigen Arbeitszeiten zwischen 07:00 Uhr und 20:00 Uhr (ausgenommen Ausnahmegenehmigungen) schriftlich aufgefordert
- Die Firmen werden schriftlich aufgefordert, die Umsetzung bei ihren Subunternehmern zu kontrollieren
- Die Firmen werden schriftlich aufgefordert, Motoren von Baugeräten und Baumaschinen auszustellen, wenn diese nicht benötigt werden, um unnötiges Motorenlaufen zu vermeiden
- Durchführung von wöchentlichen Erfolgskontrollen durch GG

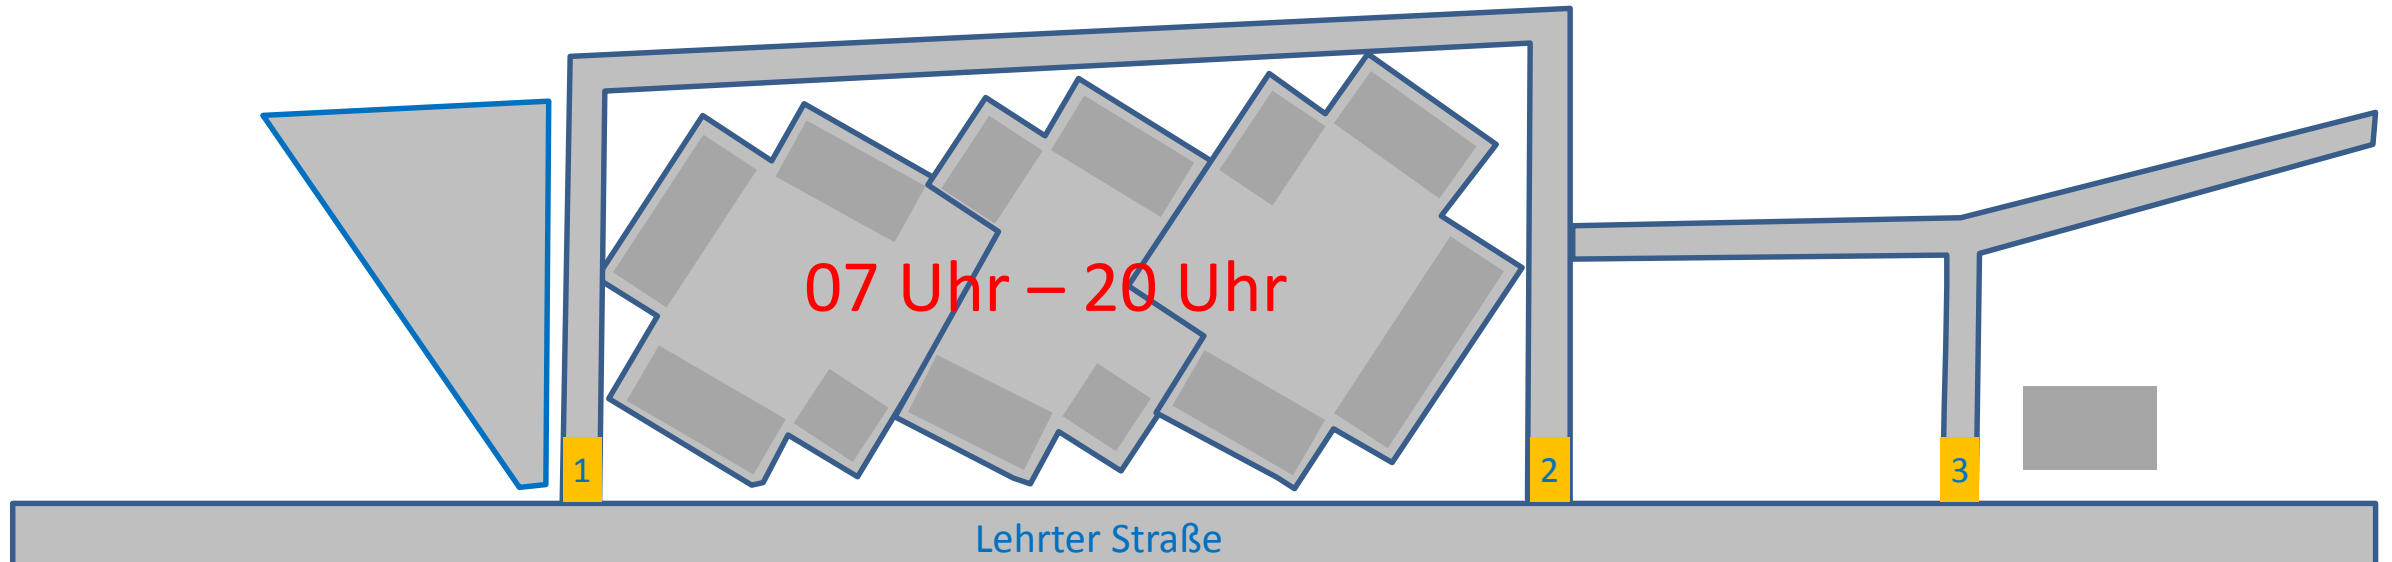

## Lehrter Straße: Immissionsminderungskonzept

- **Verminderung Verschmutzungen**

- Es werden wöchentliche Grundreinigungen im Bereich der Baustellenzufahrten durchgeführt
- Tägliche Kontrolle des Verschmutzungsgrades im Bereich der Baustellenzufahrten durch die Firmen (Bauleitung wurde hierzu aufgefordert)
- Entsprechend – bedarfsweise - zusätzliche Reinigung der verschmutzten Bereiche
- Durchführung von wöchentlichen Erfolgskontrollen durch GG

